Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**BP AMERICAS AV 30**	**166 días**	**lun 2/03/26**	**jue 10/09/2**
1		INCIO	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26
2	**1**	**ACTIVIDADES DE GESTION AMERICAS CON 26**	**30 días**	**lun 2/03/26**	**sáb 4/04/26**
7	**2**	**URBANISMO**	**81 días**	**sáb 4/04/26**	**mié 8/07/26**
8	2.1	**PRELIMINARES**	0 días	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
9	2.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	3 días	lun 6/04/26	mié 8/04/26
10	2.3	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	10 días	jue 9/04/26	lun 20/04/26
11	2.4	DEMOLICIÓN DE ANDÉN E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	15 días	mar 21/04/26	jue 7/05/26
12	2.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA ISNTALACIONES	10 días	vie 8/05/26	mar 19/05/26
13	2.6	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO B200	8 días	mié 20/05/26	jue 28/05/26
14	2.7	**ELEMENTOS URBANOS**	0 días	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
15	2.8	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA DE PLACA DE PARQUEADERO EN PAVIMENTO FLÉXIBLE	10 días	vie 29/05/26	mar 9/06/26
16	2.9	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	2 días	vie 29/05/26	sáb 30/05/26
17	2.10	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	20 días	mié 20/05/26	jue 11/06/26
18	2.11	**PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS**	0 días	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
19	2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PARA EXTERIORES FORMATO 15X18, COLOR TERRACOTA.	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26
20	2.13	MATERAS EN LADRILLO COMÚN (CON INPERMEABILIZACIÓN, H=60 CM) PASTO NATURAL	20 días	vie 12/06/26	sáb 4/07/26
21	2.14	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE DATOS**	0 días	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
22	2.15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE BARRERA VEHICULAR AUTOMÁTICA	15 días	vie 12/06/26	lun 29/06/26
23	2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1".	8 días	vie 12/06/26	sáb 20/06/26
24	2.17	SUMINISTRO E TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A	4 días	mar 30/06/26	vie 3/07/26
25	2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE INTERNET NO INCLUYE CABLE	4 días	sáb 4/07/26	mié 8/07/26
26	2.19	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 2 x 6 +6 AWG EN COBRE PARA ACOMETIDA BIFÁSICA	6 días	lun 22/06/26	sáb 27/06/26
27	2.20	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DOBLE INCLUYE APARATO NO INCLUYE CABLE	6 días	mar 30/06/26	lun 6/07/26
28	2.21	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LINEAL LED COMERCIAL 40 W LUZ DIA NO INCLUYE CABLE	6 días	lun 29/06/26	sáb 4/07/26
29	2.22	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS**	0 días	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
30	2.23	PAGO ACOMETIDA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3 días	jue 9/04/26	sáb 11/04/26
31	2.24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA HIDRÁULICA HIDRAULICO 1/2" DE DISTRIBUCIÓN	6 días	lun 13/04/26	sáb 18/04/26
32	2.25	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA SANI	4 días	lun 20/04/26	jue 23/04/26
33	2.26	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	6 días	lun 20/04/26	sáb 25/04/26
34	2.42	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO B200	3 días	lun 27/04/26	mié 29/04/26
35	2.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUARTO PA	6 días	jue 30/04/26	mié 6/05/26
36	2.40	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**	0 días	sáb 4/04/26	sáb 4/04/26
37	2.39	RETIRO DE ESCOMBROS	2 días	jue 7/05/26	vie 8/05/26
38	2.38	ASEO FINAL	2 días	sáb 9/05/26	lun 11/05/26
39	**3**	**MODULO TIENDAS**	**65 días**	**sáb 27/06/2**	**jue 10/09/26**
40	3.1	**PRELIMINARES**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26
41	3.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	2 días	sáb 27/06/26	lun 29/06/26
42	3.3	DEMOLICIÓN DE ANDÉN E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	4 días	mar 30/06/26	vie 3/07/26
43	3.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	8 días	sáb 4/07/26	lun 13/07/26
44	3.5	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26
45	3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DADOS EN CONCRETO SIMPLE DE 4000 PSIDE 30X30 CMS	8 días	mar 14/07/26	mié 22/07/26
46	3.7	CONCRETO SIMPLE DE 28 Mpa. (4000 PSI)	8 días	mar 14/07/2	mié 22/07/26
47	3.8	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO B200	6 días	jue 23/07/26	mié 29/07/26
48	3.9	**ESTRUCTURA METALICA**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26
49	3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	25 días	mar 30/06/26	mar 28/07/26
50	3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	10 días	mié 29/07/26	sáb 8/08/26
51	3.12	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN PERFILERIA METALICA, TEJA UPVC COLOR SEGÚN DISEÑO ESPESOR 6 MM.	10 días	lun 10/08/26	jue 20/08/26
52	3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	8 días	vie 21/08/26	sáb 29/08/26
53	3.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA EN SUPERBOARD DE 10 MM	10 días	vie 21/08/26	mar 1/09/26
54	3.15	Suministro e instalación de lámina microperforada en acero galvanizado	4 días	lun 10/08/26	jue 13/08/26
55	3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN 60 CM ANCHO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 CON SOPORTES Y ANGULOS A=45 CM, PINTURA ELECTROSTÁTICA	4 días	mié 2/09/26	sáb 5/09/26
56	3.17	POCETA EN LADRILLO Y ENCHAPE DE 0.6 m * 0.4 m	2 días	mié 2/09/26	jue 3/09/26
57	3.18	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26
58	3.19	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION	4 días	lun 31/08/26	jue 3/09/26
59	3.20	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	4 días	lun 31/08/26	jue 3/09/26
60	3.21	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DOBLE INCLUYE APARATO	4 días	lun 31/08/26	jue 3/09/26
61	3.22	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LINEAL LED COMERCIAL 40 W LUZ DIA	6 días	lun 31/08/26	sáb 5/09/26
62	3.23	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E HIDRAULICAS**	0 días	sáb 29/08/26	sáb 29/08/26
63	3.24	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE	6 días	lun 31/08/26	sáb 5/09/26
64	3.25	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2"	6 días	lun 31/08/26	sáb 5/09/26
65	3.26	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**	0 días	sáb 5/09/26	sáb 5/09/26
66	3.27	RETIRO DE ESCOMBROS	2 días	lun 7/09/26	mar 8/09/26
67	3.28	ASEO FINAL	2 días	mié 9/09/26	jue 10/09/26
68	**4**	**MODULO BAÑOS**	**48 días**	**sáb 27/06/2**	**vie 21/08/26**
69	4.1	**PRELIMINARES**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26
70	4.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	1 día	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26
71	4.3	DEMOLICIÓN DE ANDÉN E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	2 días	lun 29/06/26	mar 30/06/26
72	4.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	3 días	mié 1/07/26	vie 3/07/26
73	4.5	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26
74	4.6	PLATINAS ENVEVIDAS DE SOPORTE PARA COLUMNAS DE ACERO	2 días	sáb 4/07/26	lun 6/07/26
75	4.7	CONCRETO SIMPLE DE 28 Mpa. (4000 PSI)	4 días	mar 7/07/26	vie 10/07/26
76	4.8	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO B200	3 días	mar 7/07/26	jue 9/07/26
77	4.9	POCETA EN LADRILLO Y ENCHAPE DE 0.6 m * 0.4 m	3 días	sáb 11/07/26	mar 14/07/26
78	4.10	**ESTRUCTURA METALICA**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26
79	4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, FIGURADA Y/O ROLADO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA INCLUYE PEDESTAL	15 días	lun 29/06/26	mié 15/07/26
80	4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	6 días	jue 16/07/26	mié 22/07/26
81	4.13	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN PERFILERIA METALICA, TEJA UPVC COLOR SEGÚN DISEÑO	8 días	jue 23/07/26	vie 31/07/26
82	4.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	8 días	sáb 1/08/26	lun 10/08/26
83	4.15	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA EN SUPERBOARD DE 10 MM	10 días	sáb 1/08/26	mié 12/08/26
84	4.16	SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERÁMICA BLANCO 50X50	8 días	jue 13/08/26	vie 21/08/26
85	4.17	REJILLA DE VENTILACION 20X50 CM	4 días	jue 13/08/26	lun 17/08/26
86	4.18	Camerino individual para cambio de ropa, con estructura metálica, puerta metálica con cerradura, banco interior y accesorios. Incluye materiales, mano de obra 1.20*1.20 m	6 días	jue 16/07/26	mié 22/07/26
87	4.19	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26
88	4.20	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION	3 días	jue 13/08/26	sáb 15/08/26
89	4.21	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	3 días	jue 13/08/26	sáb 15/08/26
90	4.22	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA DOBLE INCLUYE APARATO	3 días	jue 13/08/26	sáb 15/08/26
91	4.23	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LINEAL LED COMERCIAL 40 W LUZ DIA	3 días	jue 13/08/26	sáb 15/08/26
92	4.24	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E HIDRAULICAS**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26
93	4.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AHORRADOR CON ACOPLE	3 días	jue 13/08/26	sáb 15/08/26
94	4.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	3 días	jue 13/08/26	sáb 15/08/26
95	4.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE INCRUSTACIONES Y ESPEJO PARA BAÑO	3 días	jue 13/08/26	sáb 15/08/26
96	4.28	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO 1/2"	8 días	jue 13/08/26	vie 21/08/26
97	4.29	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS SENCILLO CON ACOPLE	3 días	jue 13/08/26	sáb 15/08/26
98	4.30	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**	0 días	sáb 27/06/26	sáb 27/06/26
99	4.31	RETIRO DE ESCOMBROS	2 días	lun 17/08/26	mar 18/08/26
100	4.32	ASEO FINAL	2 días	mié 19/08/26	jue 20/08/26
101		FIN	0 días	lun 2/03/26	lun 2/03/26

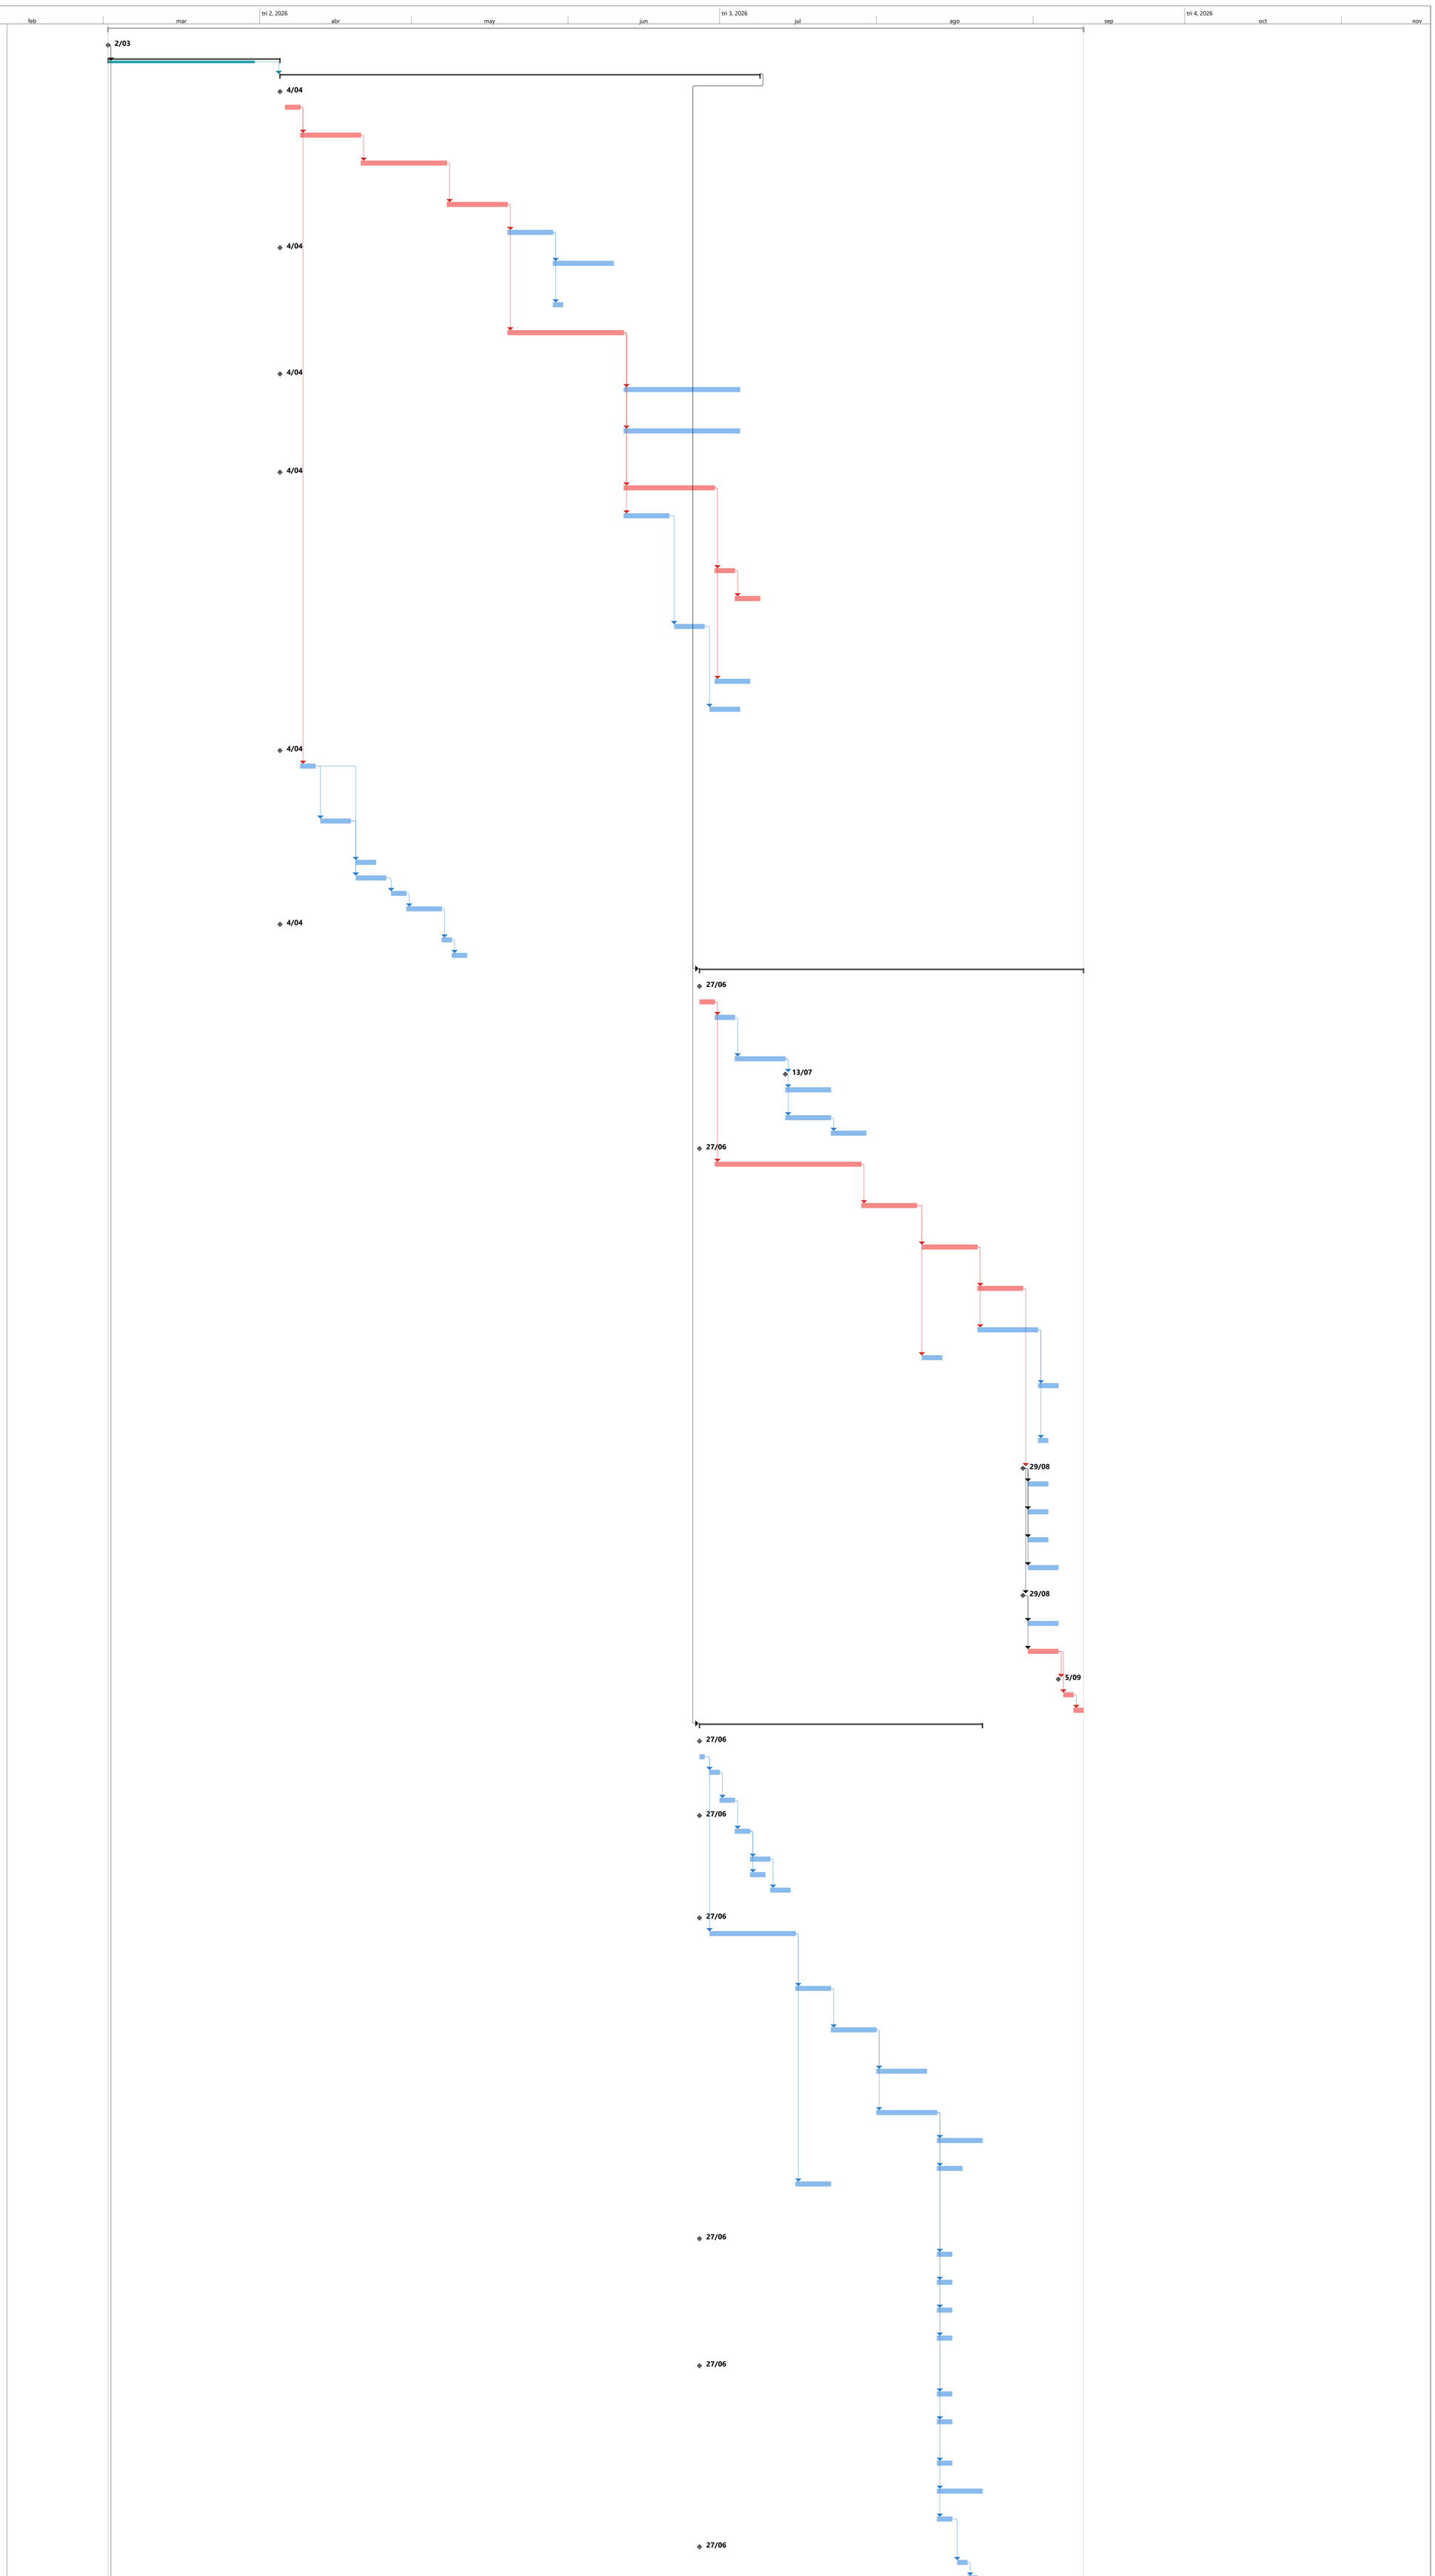

Proyecto: BP AMERICAS AV 30
Fecha: mar 10/02/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
