Responsable	ID	Nombre de proyecto	Avance	Seguimiento a Noviembre 30-2020		Tiempo en Meses	2020						2021											
				Observaciones	Evidencia		J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
SRI	P1	Renovación de la Página del Observatorio del Espacio Público.	50%	Al tratarse de un portal cuyo objetivo es suministrar información del espacio público para uso de la ciudadanía, este proyecto se replanteo y deberá realizarse en fases desarrolladas durante los cuatro años siguientes. La primera fase corresponde a la actualización del look and feel, la cual corresponde a un avance del 50%. El alcance de las demás fase se establecerá en la medida que se avance con la fase anterior.	http://observatorio.dadep.gov.co/	9																			
OS	P8	Implementación IPV6	27%	Actualmente el proyecto se encuentra en Fase de Implementación, identificando desfase de 1% debido a la continuidad de las Pruebas Piloto sobre Azure, lo cual también se incluye en la documentación del Informe de Comportamiento de Pruebas Piloto.	IPV6_IS_11202020	24																		
OS	P31	Fortalecimiento del MSPI	36%	De acuerdo al avace planificado se cumple con la meta y se sigue trabajando en el tema. El avance del 36% corresponde al promedio de ejecución de todas las actividades.	MSPI_Cronograma2020	48																		
OS	P18	Migracion a Ofice 365	100%	Se tienen migradas todas las cuentas, en ejecución se encuentra la etapa de uso y apropiación de la herramienta,la cual seguira hasta el fin del proyecto. La OS se encuentra proceso de adjudicación.	Office365_2020	6																		
OS	P20	Implementar la oficna de Proyectos a nivel Táctico	36%	Se tiene el diseño de la PMO y la definición de los formatos: Acta de Inicio, Enunciado del Alcance y Cronograma, los cuales se han ido implementando en los proyectos definidos en el PETI.	OS02_Cronograma_PMO	48																		
OCI -AU-DESPACHO	P28	Actualización de Orfeo a versión 7	60%	la fase de preparación previa se encuentra a un 50% la fase de levantamiento de información se encuentra al 30% la fase de preparación de ambientes esta al 100% La fase de comparación de tablas y datos esta al 100% La fase de migración. 20%	Documentacion_ORFEO 7 Cronograma_ORFEO 7	12																		
SAI-SRI	P2	Proyecto Escuela del Espacio público - Red de ciudades EP - Implementación de Plítica de Espacio Público & (Semillero de conocimiento)	5%	Debido a que el proceso de contratación no fue exitoso para la Fase 1. Levantamiento y diseño del portal, el proyecto será retomado en 2021		6																		
OS	P3	Definir y Establecer el gobierno de las TICS en la entidad	43%	Se han definido y documentado los procedimiento correspondientes al Dominio Evaluar, Orientar y Supervisar el cual asegura que los objetivos de la entidad sean logrados, evaluando las necesidades de los interesados.	OS03_Cronograma_GTI	18																		
OAJ -DESPACHO	P30	Portal para la consolidacion de Conceptos y Normativas del DADEP	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a finales del 2021	NA	12																		
SRI	P4	Implementar una herramienta de inteligencia de negocios y minería de Datos.	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a finales del 2020	NA	12																		
SRI	P5	Implementar una Infraestructura de Datos Espaciales para el Espacio Público del Distrito Capital.	NA	Esta planeado para iniciar ejecución en el segundo trimestre del 2021	NA	12																		
OS	P32	Implementación de un Bus de servicios	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a finales del 2021	NA	12																		

OS	P16	Arquitectura Empresarial	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a finales del 2022	NA	12	
OS	P13	Gestor de cuentas de usuario	95%	El gestor pretende mejorar la seguridad de la información para las claves de usuarios en los diferentes aplicativos de la entidad, orquestandola con el directorio activo.	https://cuenta.dadep.gov.co	8	
SAI-SAF-SRI	P9	Evolución del SIDEP y SIGDEP	73%	La evolución para esta vigencia se mide a través de los compromisos adquiridos para el nuevo marco normativo contable. Donde se an realizado 11 de 15 evolutivos planeados. El historial de despliegues en el repositorio GIT se puede consultar en la siguiente URL: http://integracion.dadep.gov.co/git/sidep/sidep/releases	http://integracion.dadep.gov.co/git/sidep/sidep/releases SIDEP	48	
OS -SAI	P6	Estrategias publicitarias, logísticas, sociales y de diseño urbano	NA	Esta planeado para iniciar ejecución en el cuarto trimestre del 2021	NA	12	
SAI	P7	Portal Inmobiliario	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2021	NA	8	
OC	P10	Carteleras digitales -Consola de sonido(7)	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2022	NA	8	
AC	P11	Mejoras en la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2022	NA	8	
AC	P12	Super CADE movil (Mailing) e interoperabiidad	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2022	NA	12	
OS	P14	Actualización del portal SUMA	75%	Se han cumplido de la primera fase los hitos: Backend API Usuarios, Front end General, Login Parte 1, Persona Juridica, Persona Natural, Usuario, Seguridad, Dashboard Entidades,Login Parte 2., dando como resultado un avance del 75% de la primera fase programada.	SUMA_Diagnóstico, Arquitecrtura 06-Noviembre 2020	24	
SRI-SAI	P15	Contratar el servicio de drones que permita agilizar y documentar el proceso de recepción de zonas de cesión y ocupaciones indebidas del espacio público	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2021	NA	38	
OS-OCI	P17	Mejora integral al sistema MAP, que permita generar la autoevaluación, confrontación, cálculos, reportes y graficas e informes, así como la interoperabilidad con CPM para la	5%	Se ha avanzdo en: generar base de datos, la adecuación de ambientes de desarrollo y el diseño. Las diferentes fases del proyecto se iran programando a medida que se vayan finalizando las anteriores.	Cronograma_cpm2 Procesos	12	
OAP	P19	Se requiere disponer de una herramienta tecnológica de acceso de información de gestión por parte de todas las dependencias del departamento para facilitar la elaboración de los	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2022	NA	12	
OS	P33	Administrador de ficheros	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2022	NA	12	

SAF	P21	Crear una herramienta tecnológica que administre todos los temas de Vinculación y administración del servidor público. En donde se evidencie todo el recorrido y la situación	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2022	NA	8	
SAF	P22	Crear una herramienta tecnológica para seguimiento de Proyectos APP en cada una de sus etapas.	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a finales del 2022	NA	12	
OS-SAF-DESP	P23	Mesa de ayuda	100%	se encuentra implementado en demo y sigue la contratación del licenciamiento formal y sus evolutivos.	http://gestionservicios.dadep.gov.co/usdkv8/#/login/	8	
SAF	P24	Crear una herramienta tecnológica para desarrollo y administración del Sistema de seguridad y salud en el trabajo del DADEP.	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2022	NA	6	
SAF-OAJ-DESPACHO	P25	Evolución del sistema SICAPITAL	70%	Se adecuó para los temas de bogdata con lo compromisos.	Cronograma_SICAPITAL	8	
SAF	P26	Creación de herramienta para seguimiento a las acciones que se deben realizar en cada uno de los planes de la Gestión Ambiental de la Entidad.Intranet	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2022	Cronograma_SICAPITAL	8	
OC	P27	Seguimiento en redes sociales a temas que involucren y afecten de manera positiva o negativa la imagen de la entidad.	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2022	NA	6	
SRI	P29	Fortalecimiento de la Batería de indicadores del Espacio público	NA	Esta planeado para iniciar ejecución a inicios del 2021	NA	18	



Avance del proyecto
Procesos de contratación
Duración del proyecto

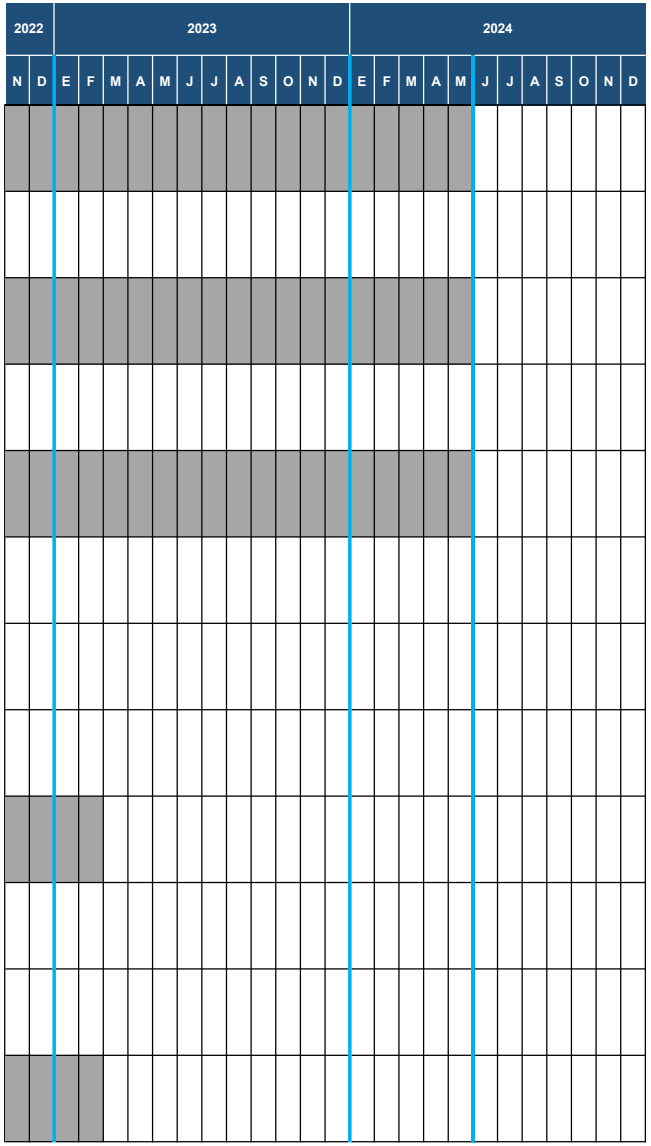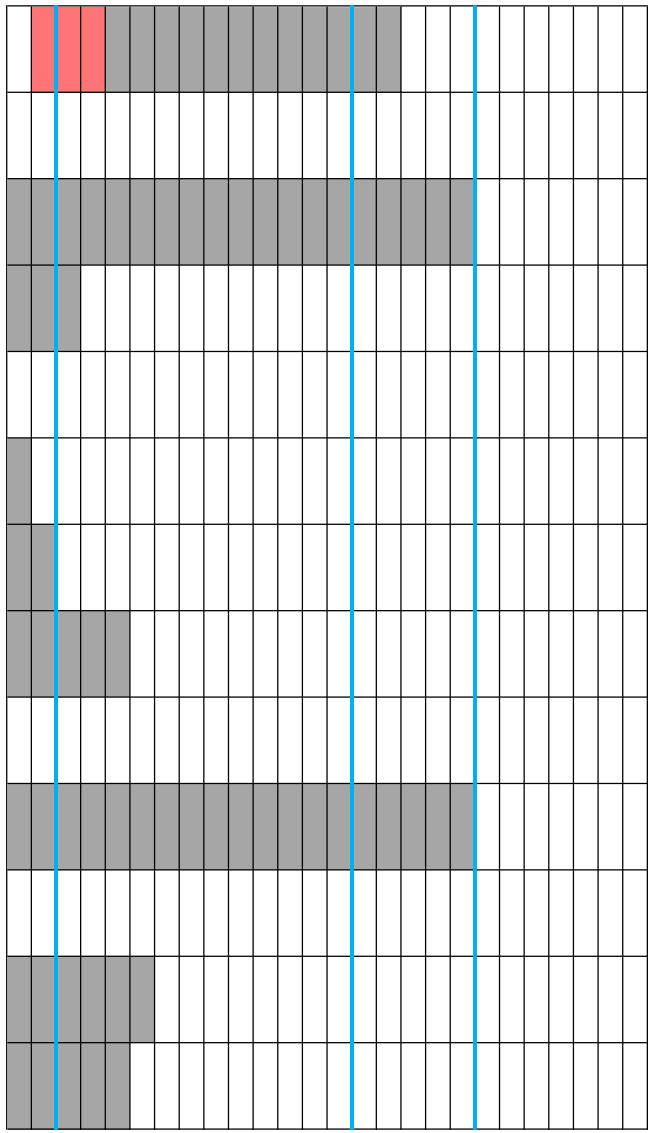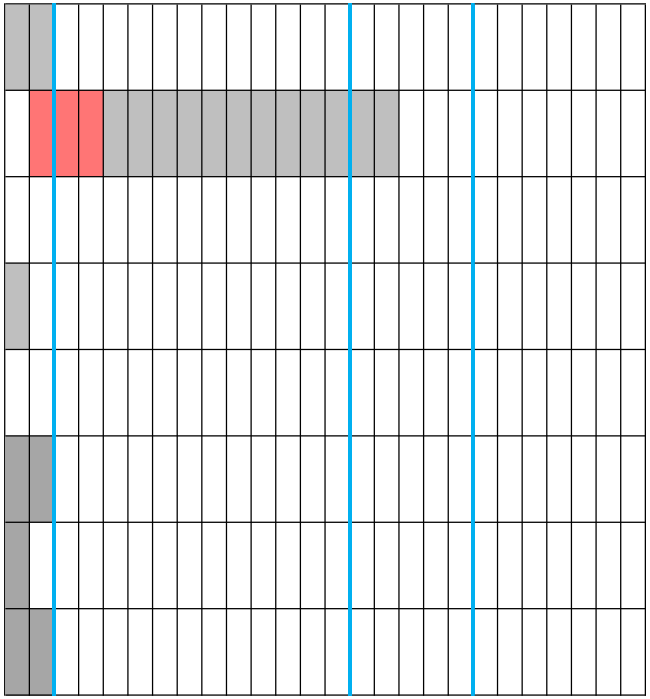
2022
2023
2024
N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
